

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況


1.市渡高架橋他

高架橋工事状況



19.立岩トンネル(ルコツ)

坑内状況

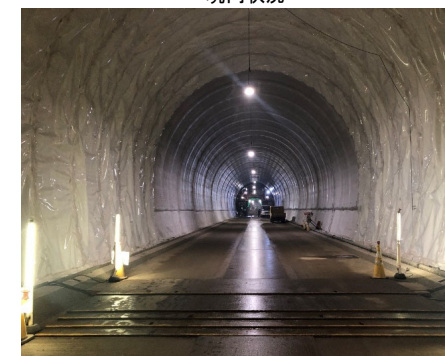

33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況




44.ニツ森トンネル(尾根内)

坑内状況



50.後志トンネル(天神)他

坑内状況

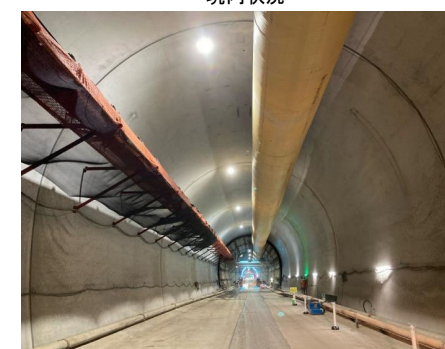

トンネル工事進捗状況


No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一体化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,342m	38%	489m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,700m	80%	2,037m	
5	渡島トンネル(南鶴)	3,900m	1,272m	33%	141m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,510m	5,065m	92%	3,626m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	3,707m	82%	645m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,300m	3,921m	74%	3,239m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,957m	95%	2,220m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,892m	92%	1,940m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一体化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,775m	100%	2,714m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,183m	94%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,781m	96%	3,423m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,534m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	2,065m	100%	1,596m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	2,165m	100%	1,523m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	1,340m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	4,349m	78%	3,240m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,793m	56%	1,383m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,678m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	2,464m	59%	1,041m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,678m	66%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	4,072m	88%	2,474m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	1,474m	45%	749m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,791m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,879m	71%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	2,578m	58%	1,718m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,906m	90%	2,673m	
53	札樽トンネル(石倉)他	4,506m	1,911m	42%	0m	
54	札樽トンネル(銭函)	4,000m	1,307m	33%	0m	
55	札樽トンネル(星置)	4,400m	865m	20%	0m	
56	札樽トンネル(富丘)	4,500m	2,078m	46%	0m	
57	札樽トンネル(札幌)	8,446m	1,477m	17%	0m	
58	札樽トンネル(桑園)他	346m	120m	35%	0m	進捗率から求めた換算値
合計		168,926m	128,475m	-	92,671m	※1

明かり工事進捗状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋、橋脚基礎工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	高架橋、橋脚基礎工事中
16	遊楽部高架橋	1,083m	高架橋、橋脚基礎工事中
23	国縫高架橋	2,138m	高架橋、橋脚基礎工事中
24	花岡高架橋	2,639m	高架橋、橋脚基礎工事中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋、橋脚工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋、橋脚工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	高架橋、橋脚工事中
29	共立路盤	3,921m	高架橋、橋脚基礎工事中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋、橋脚工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋、橋脚工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚工事中
42	琴平高架橋	3,395m	高架橋、橋脚基礎工事中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋、橋脚基礎工事中
58	札樽トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌駅高架橋(JR委託)	799m	新幹線高架橋、在来線改修工事中
60	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚工事中

設備工事進捗状況

No	工事種類	工区名	備考
61	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中
62	軌道工事	渡島南軌道敷設	準備中

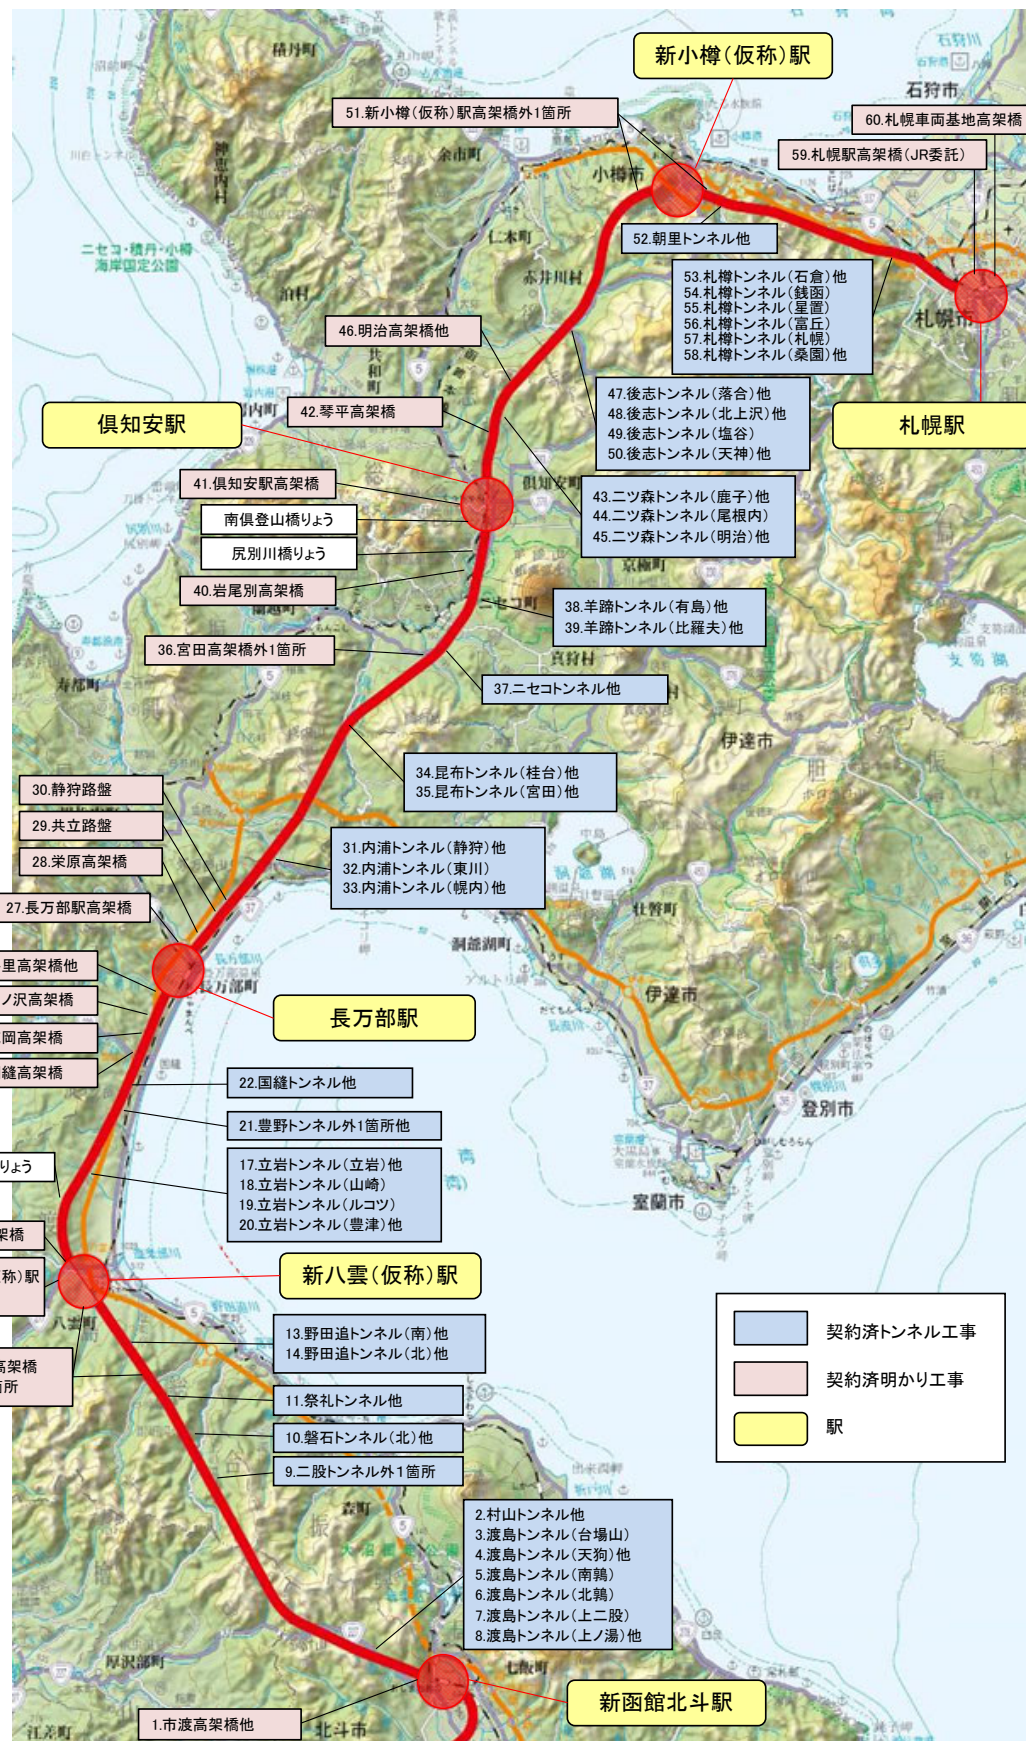

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	76%

●工事状況

- 本坑掘削完了 **15工区**
- 本坑掘削中 **25工区**
- 明かり工事施工中 **19工区**
- 準備中 **1工区**
- 計 **60工区**

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率
