北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

令和5年5月1日現在

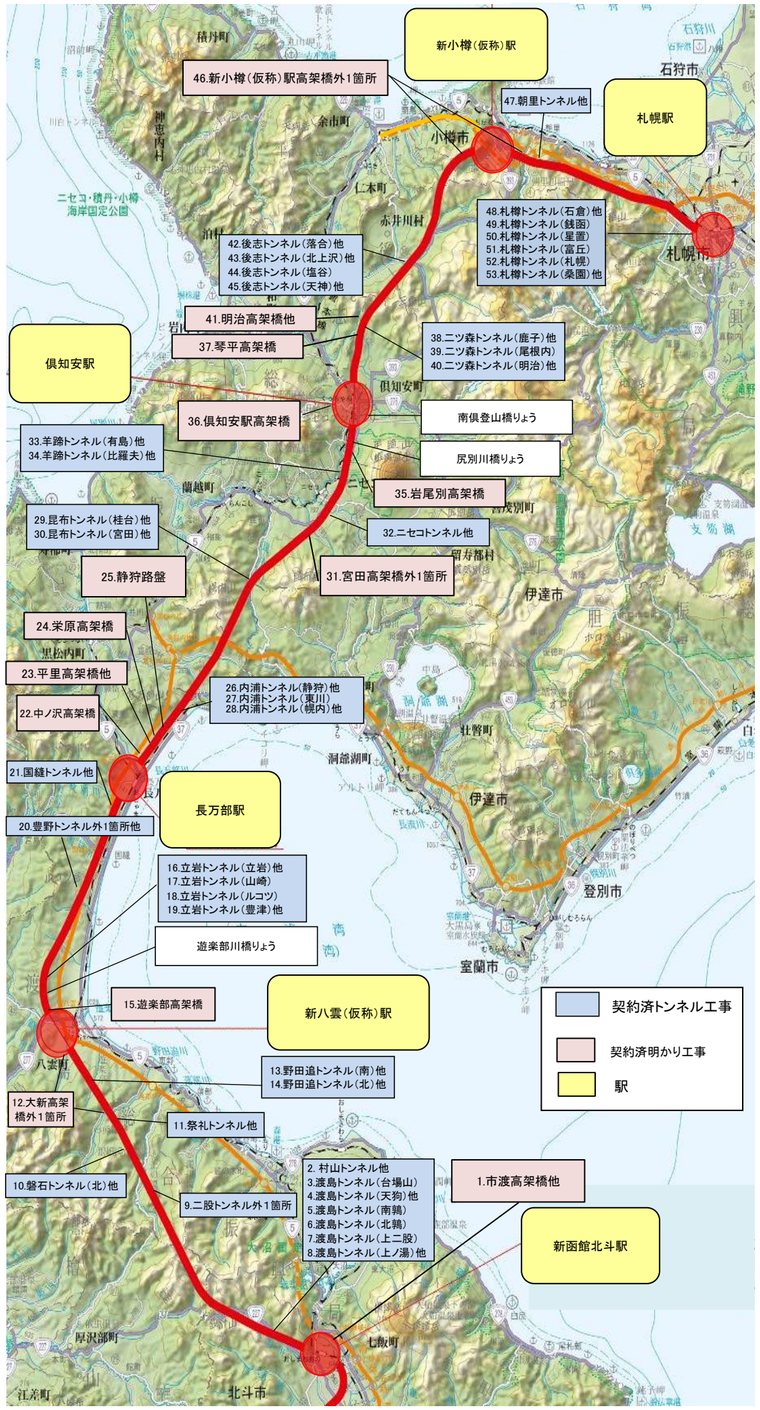

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル（台場山）	3,500m	1,094m	31%	0m	
4	渡島トンネル（天狗）他	4,600m	2,839m	62%	1,512m	
5	渡島トンネル（南鶉）	4,400m	807m	18%	0m	
6	渡島トンネル（北鶉）	5,000m	4,256m	85%	3,166m	
7	渡島トンネル（上二股）	4,540m	2,180m	48%	0m	
8	渡島トンネル（上ノ湯）他	5,310m	2,914m	55%	2,094m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,514m	81%	1,800m	磐石トンネル（南）を含む
10	磐石トンネル（北）他	3,150m	2,074m	66%	1,053m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,678m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル（南）他	3,675m	3,495m	95%	2,181m	
14	野田追トンネル（北）他	4,550m	3,994m	88%	3,266m	
16	立岩トンネル（立岩）他	5,015m	5,015m	100%	4,964m	
17	立岩トンネル（山崎）	4,960m	3,423m	69%	2,121m	
18	立岩トンネル（ルコツ）	5,000m	4,885m	98%	3,962m	
19	立岩トンネル（豊津）他	2,065m	1,662m	80%	672m	
20	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,610m	74%	1,012m	幌内トンネルを含む
21	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	241m	
26	内浦トンネル（静狩）他	5,570m	3,586m	64%	2,406m	
27	内浦トンネル（東川）	5,000m	1,926m	39%	680m	
28	内浦トンネル（幌内）他	5,000m	4,751m	95%	3,570m	
29	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
30	昆布トンネル（宮田）他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
32	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,163m	
33	羊蹄トンネル（有島）他	4,166m	1,201m	29%	36m	
34	羊蹄トンネル（比羅夫）他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
38	二ツ森トンネル（鹿子）他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
39	二ツ森トンネル（尾根内）	4,615m	3,252m	70%	2,073m	
40	二ツ森トンネル（明治）他	3,255m	572m	18%	0m	
42	後志トンネル（落合）他	4,865m	4,865m	100%	4,512m	
43	後志トンネル（北上沢）他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
44	後志トンネル（塩谷）	4,050m	1,822m	45%	288m	
45	後志トンネル（天神）他	4,460m	1,829m	41%	1,166m	
47	朝里トンネル他	4,328m	3,547m	82%	1,949m	
48	札樽トンネル（石倉）他	4,506m	832m	18%	0m	
49	札樽トンネル（銭函）	4,000m	427m	11%	0m	
50	札樽トンネル（星置）	4,400m	58m	1%	0m	
51	札樽トンネル（富丘）	4,500m	331m	7%	0m	
52	札樽トンネル（札幌）	8,446m	1,429m	17%	0m	
53	札樽トンネル（桑園）他	346m	41m	12%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合　計		168,926m	107,454m	－	76,269m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚基礎工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,873m	準備中
15	遊楽部高架橋	1,084m	準備中
22	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
23	平里高架橋他	1,838m	準備中
24	栄原高架橋	2,534m	準備中
25	静狩路盤	4,412m	準備中
31	宮田高架橋外1箇所	1,136m	準備中
35	岩尾別高架橋	2,354m	準備中
36	倶知安駅高架橋	3,160m	準備中
37	琴平高架橋	3,395m	準備中
41	明治高架橋他	976m	準備中
46	新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所	360m	準備中
53	札樽トンネル（桑園）他	659m	準備中

進ちょく率

	延長	契約率	掘削率※2
路盤	211.9km	93%	64%

●工事状況

本坑掘削完了	10工区
本坑掘削中	30工区
明かり工事施工中	1工区
準備中	12工区
計	53工区

※1：単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2：掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況

18.立岩トンネル（ルコツ）

防水工状況

28.内浦トンネル（幌内）他

坑内状況

39.二ツ森トンネル（尾根内）

防水工状況

45.後志トンネル（天神）他

覆工状況
